



ASSOCIATION INTERCOMMUNALE  
POUR LA REVITALISATION  
DE LA PETITE GLÂNE

## Procès-verbal de l'assemblée des délégués du jeudi 27 novembre 2025

### 1. Ouverture de l'assemblée

A 19h00, **M. Lucien Quillet, président**, ouvre la séance à la salle communale de Montmagny. Il informe que l'assemblée sera enregistrée à des fins de rédaction du PV. L'enregistrement sera ensuite effacé.

Après avoir salué Mesdames et Messieurs les délégués, il souhaite une cordiale bienvenue aux membres du Comité de direction. Il excuse les personnes absentes.

Toutes les personnes présentes ont été convoquées selon les statuts. 12 délégués sont présents ; le quorum est donc atteint. La majorité absolue est fixée à 7 voix.

Les scrutateurs désignés pour cette séance sont Mme Anne-Pascale Collaud de St-Aubin et M. David Loup de Vully-les-Lacs.

**M. Lucien Quillet, président**, soumet l'ordre du jour. Il ne fait l'objet d'aucune remarque.

### 2. Contrôle des présences

La liste des présences est établie ; elle sera annexée au présent procès-verbal.

### 3. PV de l'assemblée des délégués du 22 mai 2025

Le procès-verbal de la précédente assemblée des délégués n'est pas lu puisqu'il était joint à la convocation d'assemblée.

#### 3.1 Adoption

Aucune modification n'étant demandée, le procès-verbal est soumis au vote tel que présenté. Il est accepté à l'unanimité avec remerciements à son auteur.

### 4. Etat d'avancement du projet

**M. Lucien Quillet** cède la parole à **M. Julien Devanthéry** du bureau CSD pour la présentation des points suivants : *(cf présentation annexée)*



## 4.1 Etape 1

98% des travaux ont été exécutés et les travaux touchent à leur fin. Quelques finitions sont prévues ; notamment des adaptations du lit mineur et génie biologique. Le mobilier urbain et les panneaux didactiques sont en place depuis ce printemps.

CSD s'attèle à établir un plan d'entretien des berges qui sera remis au canton.

## 4.2 Etape 2

Les travaux de protection du mat HT de Groupe E était une phase importante de cette étape. Les travaux sont terminés et l'infrastructure a bien réagi à la crue de ces derniers jours.

Les prochaines exécutions seront des plantations. Des retouches diverses sont prévues au printemps, lorsque la terre sera moins détrempée.

## 4.3 Planning

La remise en état d'un tronçon de chemin AF est agendé au printemps. Ces travaux devraient être terminés pour juin 2026.

## 4.4 Etape 3

L'entreprise de génie civil mandaté sur cette étape, Gasser, a débuté les travaux en mai 2025. Depuis deux mois, l'exécution est quelque peu ralentie à cause de conditions météorologiques difficiles. Par conséquent, il a été décidé de replier le chantier et de le suspendre jusqu'à mars. Ces prochains jours, Gasser mettra la zone en sécurité et retirera ses machines de chantier.

Les investigations et analyses relatives à la valorisation des matériaux terreux sont en cours. Les procédures seront lancées sur les deux cantons prochainement.

## 4.5 Points particuliers

### Déversoir du Chaffard

Pour rappel, le projet prévoyait la démolition et la reconstruction à l'identique du déversoir d'orage. Cette étape a été exécutée en juillet. Suite à une erreur d'implantation du géomètre, le déversoir a été reconstruit 9 mètres trop loin. Dès lors deux variantes ont été évaluées : la démolition du déversoir et l'implantation à l'endroit prévu initialement ou le maintien du nouveau déversoir en place et l'adaptation du projet de l'AIRPG. Les diverses parties concernées ont opté pour cette deuxième solution, tout en veillant à garantir les surfaces exploitables aux propriétaires concernés. Un accord a été trouvé entre toutes les parties, un dossier technique a été établi et passera en consultation à l'exécutif de la commune de Vallon puis sera transmis à la préfecture. Les conséquences financières seront prises en charge par l'assurance du bureau de géomètre qui a fait la mauvaise implémentation.



Des éléments provisoires, pour la période de pause des travaux, seront installés au déversoir, les berges sont également sécurisées sur ce secteur avant la suspension du chantier.

### Découverte archéologique

Des vestiges ont été découverts en amont du pont du Chaffard, sur la Commune de Vallon : un puit encore en bon état, un bassin et des objets. Cette découverte est classée par les archéologues d'ordre majeur. Ces vestiges sont en possession du service archéologique du Canton de Fribourg et seront immergés dans le Lac de Neuchâtel pour garantir leur conservation. Cette découverte n'a pas engendré de retard pour notre projet et elle fera l'objet d'un panneau didactique.

## 4.6 Ouvrage d'art

Pont AgriCO : Une séance est prévue prochainement entre les divers services cantonaux, l'ECPF l'AIRPG et la Commune de St-Aubin afin de faire avancer ce dossier qui a été bloqué suite à deux préavis défavorables.

Pont Marais Delé, Vully-les-Lacs : la mise à l'enquête de cet ouvrage est prévue au premier trimestre 2026.

Pont Missy : sera mis en examen préalable prochainement. Un retour du service compétent est espéré à fin février. Un préavis sera présenté au législatif de Missy lors de sa séance de mars 2026.

La possibilité d'un appel d'offres groupées a été évoquée lors des comités. Cela donnerait l'opportunité aux entreprises intéressées de soumettre une offre pour un lot, plusieurs lots ou même la totalité des 3 lots. Les délais de construction des ponts seront décalés et fixés au préalable.

JD se met à disposition pour répondre aux questions.

Mme Isabelle Guerry, syndique de Vallon, demande en quels matériaux seront les mobiliers urbains.

JD indique que les bancs et tables sont en bois naturel, du même type que ceux installés à St-Aubin.

## 5. Budget 2026

### 5.1 Présentation

**M. Lucien Quillet** cède la parole à **Mme Béatrice Wolf, boursière.**

Elle informe avoir joint le budget 2026 à la convocation de cette séance et passe à leur présentation :

### Comptes d'investissements

### Travaux d'aménagement



Les dépenses des travaux d'aménagement sont essentiellement sur l'étape 3.

### Achats de terrain

Des achats de terrain sont prévus sur les trois étapes.

- Etape 1 : Etat de Fribourg, tiers St-Aubin.
- Etape 2 : Commune VLL.
- Etape 3 : Commune Vallon, Commune Missy, tiers Vallon (Paroisse).

Pas d'achats prévus à des tiers pour sur les communes de Vully-les-Lacs et Missy.

M. Gilles Vuillème demande si le prix d'achat des terrains sont fixés.

Mme Béatrice Wolf répond par l'affirmatif car il avait été déterminé pour l'établissement du budget initial du projet.

### Ouvrages d'art

Pont AgriCo : Les dépenses, subventions et contributions sont prévus pour le pont d'AgriCo, en majorité sur 2026. Le montant prévu en 2025 a été reporté.

Pont Marais Delé : Le montant budgétisé ne comprend que des honoraires pour 2026. Les travaux étant prévus au début 2027.

Pont Missy : Le montant budgétisé ne comprend que des honoraires pour 2026. Les travaux étant prévus en 2027.

### Subventions

Mme Béatrice Wolf rappelle le ratio à appliquer sur les dépenses afin d'obtenir les montants des subventions :

- La Confédération subventionne le 80% et l'Etat de Fribourg subventionne 5% de 57.2% des travaux d'aménagement.
- Pour les ponts, la part à charge des propriétaires n'est pas subventionnée. (soit 22.9 % Pont AgriCo, 40% Pont Vully-les-Lacs, 40% Missy).

### Contribution :

Elle indique que des acomptes seront demandés afin de réduire les charges d'intérêt du crédit de construction, soit :

- Acomptes pour les travaux réalisés sur l'aménagement aux Communes de Vully-les-Lacs, Missy et Vallon.
- Acompte pour travaux réalisés sur le Pont d'AgriCO (part à charge du propriétaire)

### Sponsoring

Une recette de CHF 340'000.- est prévue selon convention entre l'ECPF, l'Etat de Fribourg et l'AIRPG.

### Comptes de fonctionnement

La boursière annonce avoir gardé des montants quasiment identiques aux années précédentes pour les diverses dépenses relatives au fonctionnement de l'association.

Une adaptation est faite en rapport au nouvel organe de révision qui a été mandaté à la précédente assemblée.



Les frais d'intérêts sont calculés sur la base d'un taux prévu à 1.70% pour 2026. Lors de l'établissement du budget 2025, le taux était surévalué et les intérêts 2025 seront nettement moindre que ce qui a été annoncé à l'assemblée de l'année passée. De plus, il y a également eu moins de dépenses en 2025 que ce qui était envisagé.

## Participations communales

Ce tableau résume les charges à prévoir dans les budgets communaux respectifs.

La parole est donnée aux délégués. Il n'y a pas de question.

## 5.2 Rapport de la commission financière

**M. Lucien Quillet** cède la parole à la commission des finances composée de MM. Alexandre Bardet, Nicolas Pilet et Michaël Ballaman. **M. Mickaël Ballaman** donne lecture de leur rapport et propose d'accepter le budget tel que présenté.

**M. Lucien Quillet** ouvre la discussion.

La parole n'étant pas demandée, le budget 2026 est soumis au vote.

## 5.3 Approbation

Le budget 2026 est accepté à l'unanimité.

## 6. Divers

**M. Lucien Quillet** cède la parole aux délégués.

Aucune intervention des délégués.

**M. Didier Schouwey, président du Codir AIRPG**, remercie le bureau CSD pour le bon suivi du projet, la commission des finances pour le partage lors de séances constructives, la secrétaire-boursière pour le suivi et la réactivité dans le processus des demandes de subventions. Il indique que la fin de cette législature amènera du changement et rappelle que la transition des représentants fribourgeois et vaudois est différée. Pour cette raison, la prochaine assemblée sera avancée (fin mars, début avril 2026). La date sera communiquée lors de l'envoi du PV de cette séance.

La parole n'étant plus demandée, **M. Lucien Quillet** remercie les membres du Codir et clôt la discussion.

**M. Alain Bally**, en qualité de **vice-syndic de Vully-les-Lacs** qui accueille cette assemblée, invite chacun à rester à la collation qui suivra pour fraterniser un instant.

**M. Lucien Quillet** remercie les personnes présentes et clôt la séance à 19h50.



St-Aubin, le 27 novembre 2025

Le président de l'assemblée :

L. Quillet

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Quillet', with a long horizontal stroke extending to the right.

La secrétaire de l'assemblée :

B. Wolf

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. Wolf', with a stylized, cursive script.

Annexes :

- Liste des présences et excusés
- Rapport de la commission financières
- Présentation du bureau CSD utilisée lors de l'assemblée

## Liste des présences



ASSOCIATION INTERCOMMUNALE  
POUR LA REVITALISATION  
DE LA PETITE GLÂNE

### Président assemblée

Lucien	Quillet	Président des délégués	
--------	---------	------------------------	--

### Délégués de l'AIRPG

Vallon			
Isabelle	Guerry	Syndique	
Michèle	Wilbert	Conseillère communale	
Gilles	Vuillème	Conseiller communal	
Vincent	Contesse	Conseiller communal	
Olivier	Ballaman	Suppléant	

### St-Aubin

Christel	Tschanz	Conseillère communale	
Anne-Pascale	Collaud	Conseillère communale	
Michaël	Ballaman	Membre COF	
Jonathan	Ramuz	suppléant cons. comm.	excusé

### Vully-les-Lacs

Michel	Verdon	Syndic	excusé
Jérémie	Christinat	Conseiller Communal	
David	Loup	Conseiller Communal	
Fabienne	Vessaz	Suppléante	excusée

### Missy

Olivier	Thévoz	Syndic	excusé
Nicolas	Pilet	Conseiller Municipal	
Lucien	Quillet	Conseiller Général	
Robert	Rochette	Conseiller Général	excusé
Elodie	Mathis	Suppl. Conseiller Général	

### Comité de direction de l'AIRPG

Alain	Bally	Conseiller Communal, Vully-les-Lacs	
Laurent	Morel	Conseiller Communal, Missy	
Stéphane	Vessaz	Conseiller Communal, Vallon	
Didier	Schouwey	Vice-syndic, St-Aubin	

### Représentants des cantons

Fribourg			
Daniel	Pugin	Service de l'environnement	excusé

### Vaud

Claude-Alain	Davoli	DGE, domaine des eaux	excusé
--------------	--------	-----------------------	--------

### Représentants des bureaux d'ingénieurs

Julien	Devanthery	bureau CSD	
Nicolas	Dubau	bureau CSD	excusé

### Sponsoring

Alexandre	Ghiraldi	Broye Source de Vie	excusé
-----------	----------	---------------------	--------

## Liste des présences



ASSOCIATION INTERCOMMUNALE  
POUR LA REVITALISATION  
DE LA PETITE GLÂNE

Philippe	Savary	Broye Source de Vie	<i>excusé</i>
----------	--------	---------------------	---------------

### Presse

La Broye, Philippe Causse	
La Liberté	
Le Républicain, Jacques Volery	
Le 24h	

### Autres personnes

*Veuillez svp indiquer votre prénom et nom, institution*




## **Rapport de la commission financière relatif au budget de fonctionnement/investissements 2026**

**Assemblée des délégués du 27 novembre 2025**

La commission financière a examiné en date du 29 octobre 2025 le budget préparé par le comité de direction pour l'année 2026 conformément à l'art. 72 de la Loi sur les finances communales. Madame Béatrice Wolf, secrétaire-boursière, a présenté et détaillé les chiffres des différents postes. Elle a répondu aux diverses questions des membres de la commission.

Au terme de l'analyse, nous constatons des charges pour l'année 2026 de CHF 35'640.00 et des produits à hauteur de même montant compte tenu de la participation des communes membres. En comparaison au budget de 2025, la diminution est notamment expliquée par la réduction des charges d'intérêts sur le compte courant bancaire.


Sur la base des documents et explications fournies, nous confirmons que le présent budget comprend tous les produits et toutes les charges pour l'année à venir.

Aussi, le comité de direction a présenté à satisfaction de la commission le budget des investissements prévus en 2026. Celui-ci fait état d'investissements à hauteur de CHF 4'736'367.00 contre des subventions de CHF 4'489'353.49.

Sans autre commentaire, la commission financière recommande à l'assemblée des délégués d'accepter le budget 2026 soumis par le comité de direction.

Saint-Aubin, le 29 octobre 2025

Pour la commission financière



Michaël Ballaman

Nicolas Pilet







# Assemblée générale des délégués

27 novembre 2025 / Montmagny



## Assemblée des délégués de l'AIRPG – 27 novembre 2025

### Ordre du jour



1	Ouverture de l'assemblée
2	Contrôle des présences
3	PV de l'assemblée des délégués du 22 mai 2025 et approbation
4	État de l'avancement du projet
5	Budget 2026
6	Divers





## Assemblée des délégués de l'AIRPG – 27 novembre 2025

### Ordre du jour

1	Ouverture de l'assemblée
2	Contrôle des présences
3	PV de l'assemblée des délégués du 22 mai 2025 et approbation
4	État de l'avancement du projet
5	Budget 2026
6	Divers



3

## Assemblée des délégués de l'AIRPG – 27 novembre 2025

### Ordre du jour

1	Ouverture de l'assemblée
2	Contrôle des présences
3	PV de l'assemblée des délégués du 22 mai 2025 et approbation
4	État de l'avancement du projet
5	Budget 2026
6	Divers



4



## Assemblée des délégués de l'AIRPG – 27 novembre 2025

### Ordre du jour

1	Ouverture de l'assemblée
2	Contrôle des présences
3	PV de l'assemblée des délégués du 22 mai 2025 et approbation
4	État de l'avancement du projet
5	Budget 2026
6	Divers



5

## Assemblée des délégués de l'AIRPG – 27 novembre 2025

### Ordre du jour

1	Ouverture de l'assemblée
2	Contrôle des présences
3	PV de l'assemblée des délégués du 22 mai 2025 et approbation
4	État de l'avancement du projet
5	Budget 2026
6	Divers




6



#### 4.1 Etapes 1 et 2

- + Fin Génie civil en novembre 2025 avec démantèlement des installations de chantier

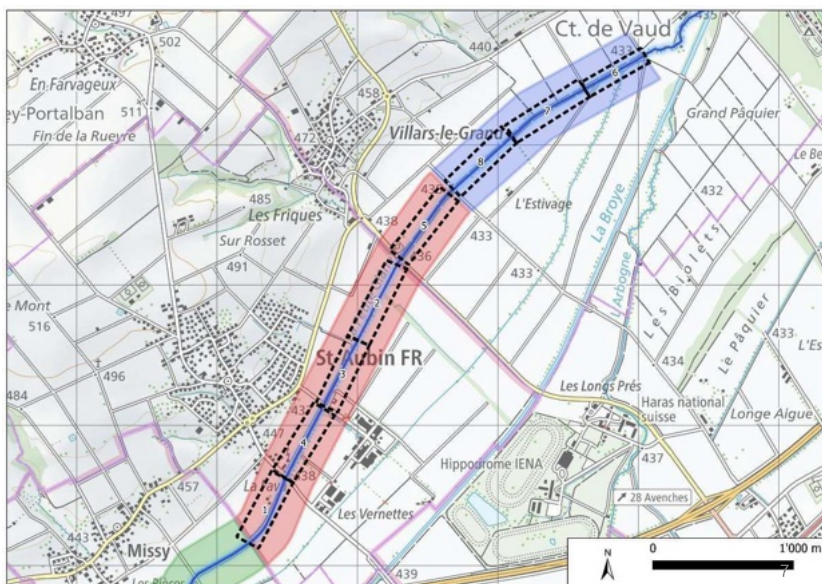

#### 4.2 Travaux

- + Saint-Aubin :
  - Quelques finitions dans le lit mineur et aux abords
  - Panneaux didactiques mis en place
  - Mobilier urbain va être mis en place prochainement
  - Murgiers à mettre en place au printemps 2026
  - Plan d'entretien à finaliser







## 4.2 Travaux

### + Vully-les-Lacs

- Travaux de génie civil achevés, y.c. sécurisation du mât Groupe E
- Valorisation de la terre végétale effectuée


#### Prochaines étapes :

- Solde des plantations en hiver 2025/26
- Finalisation retouches lit mineur, murgiers et ensemencements au printemps 2026
- Réfection chemin en béton au début du printemps 2026
- Mise en place des panneaux didactiques et du mobilier urbain au printemps 2026

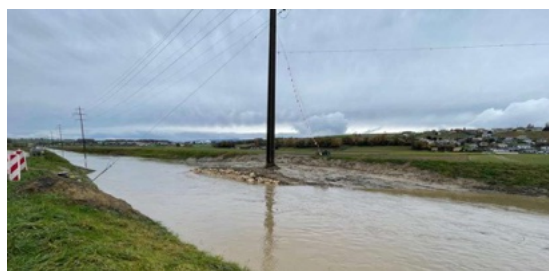

9

## 4.3 Planning

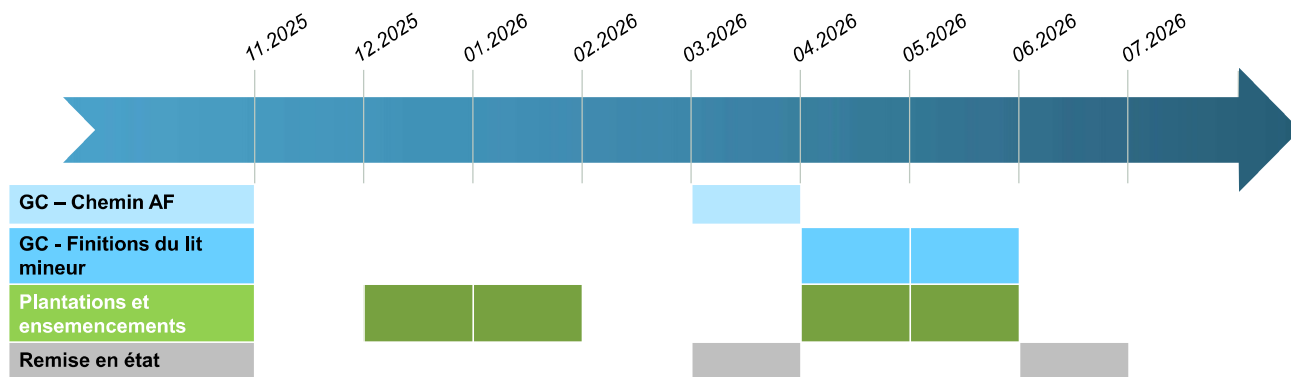

10




#### 4.4 Programmation des travaux

+ Génie civil :

- Début Génie civil (Sect. 1 + 4) :  
**05.2025**
- Fin Génie civil : **10.2026**

+ Génie biologique :

- Plantations : hiver 2025-2026 + solde  
en hiver 2026-2027
- Ensemencements : printemps 2026 et  
solde au printemps 2027

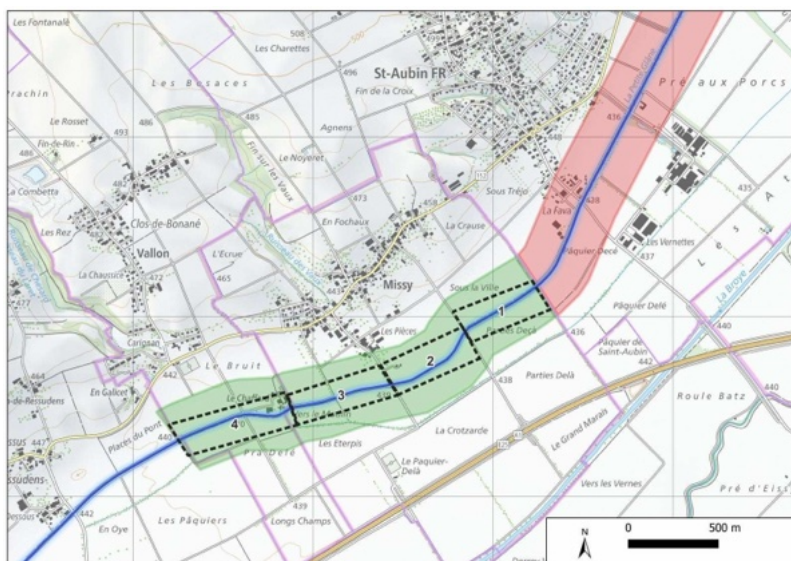

11

#### 4.5 Travaux

+ Missy-Vallon :

- Décapages réalisés
- Montage des digues réalisés
- Secteur 2 et 3 : excavations et modelage du lit  
achevés / Remblayage partiellement réalisés
- Secteur 2 : murgiers réalisés
- Sécurisation du chantier en vue d'un arrêt hivernal

Prochaines étapes :

- *Plantations en automne-hiver 2025-26 sur secteurs  
2 et 3*
- *Reprise de travaux de terrassement au printemps  
2026 (fin prévue à la fin de l'été 2026)*



12



#### 4.6. Points particuliers :

##### Déversoir du Chaffard

- + Déversoir construit à la mauvaise place du fait d'une erreur d'implantation du géomètre
- + Variante retenue :
  - Maintien du déversoir en place
  - Adaptation du projet en conséquence
  - Gestion des impacts fonciers via des conventions avec les propriétaires (accords reçus)
  - Reprise des digues / Léger surcoût à préciser avec l'entreprise et à absorber via une participation du géomètre (en cours)



13

#### 4.6. Points particuliers :

##### Découvertes archéologiques


- + Découvertes de vestiges archéologiques à fort intérêt en amont du pont du Chaffard (commune de Vallon)
- + Suivi et prélèvement par le service d'archéologie du canton de Fribourg
- + Pas de blocage ni d'impact sur le chantier



14



#### 4.7. Planning des travaux

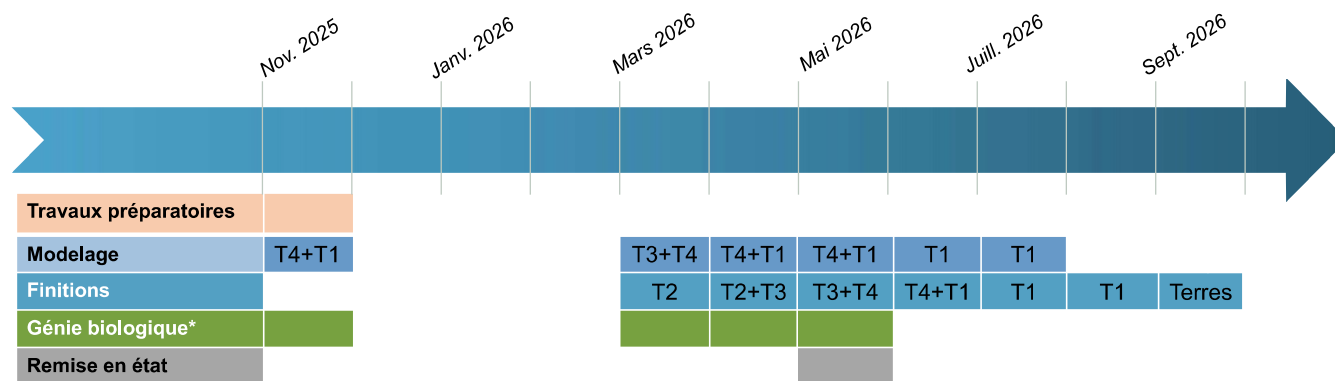

\*Génie biologique : plantations à poursuivre sur novembre/décembre 2026 + ensemencement au printemps 2027

15

#### 4.8. Ouvrages d'art

- + Pont AGRICO (St-Aubin) : Retour défavorable du canton (SMO-Service mobilité et SBC-Bien Culturels). Courrier de la commune pour confirmer le projet et demande de prise de position de la DIME. Séance prévue le 1<sup>er</sup> décembre 2025. Phase 41 hiver 2025/26 si accord pour suite du projet.
- + Pont Marais Delé (Vully-les-Lacs) : Plans terminés. Dimensionnements géotechniques et structuraux terminés. Devis estimatif en cours de finalisation. Enquête 1<sup>er</sup> trimestre 2026. Phase 41 hiver 1<sup>er</sup> trimestre 2026.
- + Pont Missy : Plans en cours de finalisation. Nécessité d'examen préalable confirmée par la DGMR. Devis estimatif en cours de mise à jour. Examen préalable décembre 25. Préavis du Conseil général en mars 2026. Enquête pour printemps 2026. Phase 41 hiver 1<sup>er</sup> trimestre 2026.

16



# Assemblée des délégués de l'AIRPG – 27 novembre 2025

## 4. Etat de l'avancement du projet - *Etats financiers et prévisions*

ETAPES	COMMUNES	LINEAIRE [m]	BUDGET GLOBAL AIRPG [TTC]					
			TRAVAUX GC + AUTRES	TRAVAUX GB	PONTS (part imputable au projet)	AQUISITION TERRAINS	HONORAIRES ET DIVERS 25%	TOTAL ETAPE
LOTS 1-2 / ETAPE 1	St-Aubin (FR) + Vully (VD)	2'900	5'021'136 CHF	805'799 CHF	967'783 CHF	1'203'550 CHF	1'836'438 CHF	9'834'706 CHF
LOTS 1-2 / ETAPE 2	Vully (VD)	1'700	3'225'376 CHF	437'129 CHF	445'878 CHF	108'500 CHF	989'633 CHF	5'206'516 CHF
LOTS 3-4 / ETAPE 3	Missy (VD) + Vallon (FR)	2'200	3'961'846 CHF	622'082 CHF	443'500 CHF	135'500 CHF	1'332'269 CHF	6'495'196 CHF
<b>TOTAL</b>		<b>6'800</b>	<b>12'208'358 CHF</b>	<b>1'865'010 CHF</b>	<b>1'857'161 CHF</b>	<b>1'447'550 CHF</b>	<b>4'158'339 CHF</b>	<b>21'536'418 CHF</b>
<b>ENGAGEMENTS CONTRACTUELS [TTC]</b>								
LOTS 1-2 / ETAPE 1	St-Aubin (FR) + Vully (VD)	2'900	4'988'970 CHF	777'562 CHF	-	-	1'128'304 CHF	6'894'836 CHF
LOTS 1-2 / ETAPE 2	Vully (VD)	1'700	4'220'463 CHF	584'951 CHF	-	-	-	4'805'415 CHF
LOTS 3-4 / ETAPE 3	Missy (VD) + Vallon (FR)	2'200	2'490'564 CHF	785'562 CHF	-	-	466'295 CHF	3'742'421 CHF
<b>TOTAL</b>		<b>6'800</b>	<b>11'699'997 CHF</b>	<b>2'148'075 CHF</b>	<b>0 CHF</b>	<b>0 CHF</b>	<b>1'594'599 CHF</b>	<b>15'442'671 CHF</b>
<b>FACTURES A FIN NOVEMBRE 2025 [TTC]</b>								
LOTS 1-2 / ETAPE 1	St-Aubin (FR) + Vully (VD)	2'900	4'268'542 CHF	773'136 CHF	-	450'000 CHF	1'740'571 CHF	7'232'248 CHF
LOTS 1-2 / ETAPE 2	Vully (VD)	1'700	3'741'233 CHF	199'347 CHF	-	-	-	3'940'580 CHF
LOTS 3-4 / ETAPE 3	Missy (VD) + Vallon (FR)	2'200	1'170'723 CHF	-	-	-	477'444 CHF	1'648'167 CHF
<b>TOTAL</b>		<b>6'800</b>	<b>9'180'498 CHF</b>	<b>972'482 CHF</b>	<b>0 CHF</b>	<b>450'000 CHF</b>	<b>2'218'015 CHF</b>	<b>12'820'995 CHF</b>
<b>PREVISIONS A TERMINAISON [TTC]</b>								
LOTS 1-2 / ETAPE 1	St-Aubin (FR) + Vully (VD)	2'900	4'650'000 CHF	850'000 CHF	1'000'000 CHF	1'203'550 CHF	1'500'000 CHF	9'203'550 CHF
LOTS 1-2 / ETAPE 2	Vully (VD)	1'700	4'150'000 CHF	650'000 CHF	500'000 CHF	108'500 CHF	983'000 CHF	6'391'500 CHF
LOTS 3-4 / ETAPE 3	Missy (VD) + Vallon (FR)	2'200	3'166'667 CHF	800'000 CHF	500'000 CHF	135'500 CHF	1'120'000 CHF	5'722'167 CHF
<b>TOTAL</b>		<b>6'800</b>	<b>11'966'667 CHF</b>	<b>2'300'000 CHF</b>	<b>2'000'000 CHF</b>	<b>1'447'550 CHF</b>	<b>3'603'000 CHF</b>	<b>21'317'217 CHF</b>

17

# Assemblée des délégués de l'AIRPG – 27 novembre 2025

## Ordre du jour

1	Ouverture de l'assemblée
2	Contrôle des présences
3	PV de l'assemblée des délégués du 22 mai 2025 et approbation
4	État de l'avancement du projet
5	Budget 2026
6	Divers

18



## 5.1 Présentation



19

## 5.2 Rapport de la commission financière

### Rapport de la commission financière relatif au budget de fonctionnement/investissements 2026

Assemblée des délégués du 27 novembre 2025

La commission financière a examiné en date du 29 octobre 2025 le budget préparé par le comité de direction pour l'année 2026 conformément à l'art. 72 de la Loi sur les finances communales. Madame Béatrice Wolf, secrétaire-boursière, a présenté et détaillé les chiffres des différents postes. Elle a répondu aux diverses questions des membres de la commission.

Au terme de l'analyse, nous constatons des charges pour l'année 2026 de CHF 35'640.00 et des produits à hauteur de même montant compte tenu de la participation des communes membres. En comparaison au budget de 2025, la diminution est notamment expliquée par la réduction des charges d'intérêts sur le compte courant bancaire.

Sur la base des documents et explications fournies, nous confirmons que le présent budget comprend tous les produits et toutes les charges pour l'année à venir.

Aussi, le comité de direction a présenté à satisfaction de la commission le budget des investissements prévus en 2026. Celui-ci fait état d'investissements à hauteur de CHF 4'736'367.00 contre des subventions de CHF 4'489'353.49.

Sans autre commentaire, la commission financière recommande à l'assemblée des délégués d'accepter le budget 2026 soumis par le comité de direction.

Saint-Aubin, le 29 octobre 2025

Pour la commission financière



Michaël Ballaman

Nicolas Pilet

20



### 5.3 Approbation

21

1	Ouverture de l'assemblée
2	Contrôle des présences
3	PV de l'assemblée des délégués du 22 mai 2025 et approbation
4	État de l'avancement du projet
5	Budget 2026
6	Divers

22
